

Projektname: Rauhebergtunnel

Meßreihennr. : 005

Meßrohrname: BK2

Datum : 21.03.23

Meßschritte: 81

Bezugsmessung : 000

Anmerkung :

Schritt Nr.	Verformung pro Meter [mm/m]	Gesamt Verformung [mm]	Kalibrierter Meßwert [µm]
1	0.1454	2.8848	64
2	0.0969	2.7395	194
3	0.0469	2.6425	364
4	0.0274	2.5956	421
5	0.0051	2.5682	276
6	-0.0147	2.5631	247
7	0.0145	2.5778	438
8	-0.0114	2.5633	493
9	0.0104	2.5747	667
10	0.0141	2.5643	750
11	-0.0061	2.5502	368
12	0.0310	2.5563	574
13	0.0424	2.5253	228
14	-0.0139	2.4830	665
15	0.0292	2.4969	480
16	0.0287	2.4676	497
17	0.0268	2.4389	639
18	0.0339	2.4121	1445
19	0.0281	2.3782	1040
20	0.0414	2.3500	723
21	-0.0128	2.3086	1309
22	0.0723	2.3214	1193
23	0.0476	2.2491	990
24	0.0223	2.2015	1529
25	0.0444	2.1792	363
26	0.0287	2.1348	1206
27	0.0272	2.1061	1373
28	0.0471	2.0789	1170
29	0.0367	2.0318	836
30	0.0222	1.9952	1544
31	0.0333	1.9729	1845
32	0.0485	1.9397	1556
33	0.0452	1.8912	1671
34	0.0187	1.8460	1577
35	0.0391	1.8274	1894
36	0.1105	1.7883	1517
37	0.0262	1.6778	1730
38	0.0365	1.6516	1767
39	0.0085	1.6152	2188

Projektname: Rauhebergtunnel
Meßrohrname: BK2
Meßschritte: 81
Anmerkung :

Meßreihenr. : 005
Datum : 21.03.23
Bezugsmessung : 000

Schritt Nr.	Verformung pro Meter [mm/m]	Gesamt Verformung [mm]	Kalibrierter Meßwert [μ m]
40	0.0235	1.6067	1631
41	0.0481	1.5832	2011
42	0.0005	1.5350	2047
43	0.0625	1.5346	1168
44	0.0158	1.4721	1716
45	0.0289	1.4563	1636
46	0.0577	1.4274	1622
47	0.0596	1.3697	1632
48	0.0490	1.3101	1532
49	0.0540	1.2611	1714
50	0.0636	1.2071	1980
51	0.1028	1.1435	2111
52	0.0143	1.0407	1541
53	0.0402	1.0263	2027
54	0.0560	0.9862	1168
55	0.0159	0.9301	1862
56	0.0565	0.9143	1878
57	0.0343	0.8578	1672
58	0.0523	0.8236	1608
59	0.0169	0.7713	1156
60	0.0431	0.7544	1515
61	0.0394	0.7112	1771
62	0.0313	0.6718	1672
63	0.0266	0.6405	1766
64	0.0542	0.6140	1789
65	0.0474	0.5597	1220
66	0.0259	0.5123	1993
67	0.0177	0.4864	1905
68	0.0400	0.4687	1727
69	0.0168	0.4286	1705
70	0.0513	0.4118	1606
71	0.0021	0.3605	1494
72	0.0300	0.3584	1946
73	0.0407	0.3284	1681
74	0.0269	0.2877	1992
75	0.0372	0.2608	1496
76	0.0225	0.2236	1986
77	0.0358	0.2011	1321
78	0.0524	0.1654	1735
79	0.0209	0.1130	2027

GLEITMIKROMETER AUSWERTUNG

Anlage 01

Projektname: Rauhebergtunnel

Meßreihennr. : 005

Meßrohrname: BK2

Datum : 21.03.23

Meßschritte: 81

Bezugsmessung : 000

Anmerkung :

Schritt Nr.	Verformung pro Meter [mm/m]	Gesamt Verformung [mm]	Kalibrierter Meßwert [μ m]
80	0.0622	0.0921	1439
81	0.0299	0.0299	2139

GLEITMIKROMETER AUSWERTUNG

Anlage 01

Projektname: Rauhebergtunnel

Meßreihennr. : 005

Meßrohrname: BK2

Datum : 21.03.23

Meßschritte: 81

Bezugsmessung : 000

Anmerkung :

Nr	Meßwert abwärts [μm]	Meßwert aufwärts [μm]	mittlerer Meßwert [μm]	Differenz zw. ab u. auf Messung [μm]
1	232	231	231	1
2	361	365	363	-4
3	535	536	536	-1
4	595	592	593	3
5	446	447	446	-1
6	418	415	417	3
7	613	608	610	5
8	664	668	666	-4
9	845	840	843	5
10	924	929	926	-5
11	542	537	539	5
12	750	746	748	4
13	399	397	398	2
14	839	841	840	-2
15	655	651	653	4
16	667	674	671	-7
17	814	813	814	1
18	1627	1632	1629	-5
19	1222	1218	1220	4
20	899	898	899	1
21	1495	1490	1493	5
22	1373	1376	1374	-3
23	1168	1171	1169	-3
24	1715	1715	1715	0
25	535	533	534	2
26	1389	1386	1388	3
27	1559	1555	1557	4
28	1354	1348	1351	6
29	1014	1012	1013	2
30	1729	1730	1729	-1
31	2037	2033	2035	4
32	1741	1744	1743	-3
33	1856	1861	1859	-5
34	1763	1763	1763	0
35	2087	2082	2085	5
36	1705	1701	1703	4
37	1918	1918	1918	0
38	1953	1958	1956	-5
39	2382	2382	2382	0

GLEITMIKROMETER AUSWERTUNG

Anlage 01

Projektname: Rauhebergtunnel
Meßrohrname: BK2
Meßschritte: 81
Anmerkung :

Meßreihennr. : 005
Datum : 21.03.23
Bezugsmessung : 000

40	1821	1815	1818	6
41	2204	2202	2203	2
42	2242	2237	2239	5
43	1345	1353	1349	-8
44	1909	1899	1904	10
45	1826	1820	1823	6
46	1812	1806	1809	6
47	1822	1816	1819	6
48	1721	1715	1718	6
49	1904	1899	1901	5
50	2172	2171	2172	1
51	2306	2302	2304	4
52	1730	1724	1727	6
53	2220	2217	2218	3
54	1351	1347	1349	4
55	2054	2049	2052	5
56	2071	2065	2068	6
57	1861	1857	1859	4
58	1796	1793	1794	3
59	1340	1335	1337	5
60	1703	1699	1701	4
61	1961	1958	1960	3
62	1861	1857	1859	4
63	1954	1956	1955	-2
64	1979	1977	1978	2
65	1400	1404	1402	-4
66	2188	2181	2184	7
67	2099	2092	2095	7
68	1918	1912	1915	6
69	1896	1890	1893	6
70	1797	1789	1793	8
71	1678	1681	1680	-3
72	2141	2132	2137	9
73	1871	1867	1869	4
74	2187	2180	2183	7
75	1682	1680	1681	2
76	2184	2170	2177	14
77	1508	1501	1504	7
78	1924	1922	1923	2
79	2220	2217	2218	3

GLEITMIKROMETER AUSWERTUNG

Anlage 01

Projektname: Rauhebergtunnel

Meßreihenr. : 005

Meßrohrname: BK2

Datum : 21.03.23


Meßschritte: 81

Bezugsmessung : 000

Anmerkung :

80	1627	1620	1623	7
81	2335	2329	2332	6

ANLAGE: 01 A

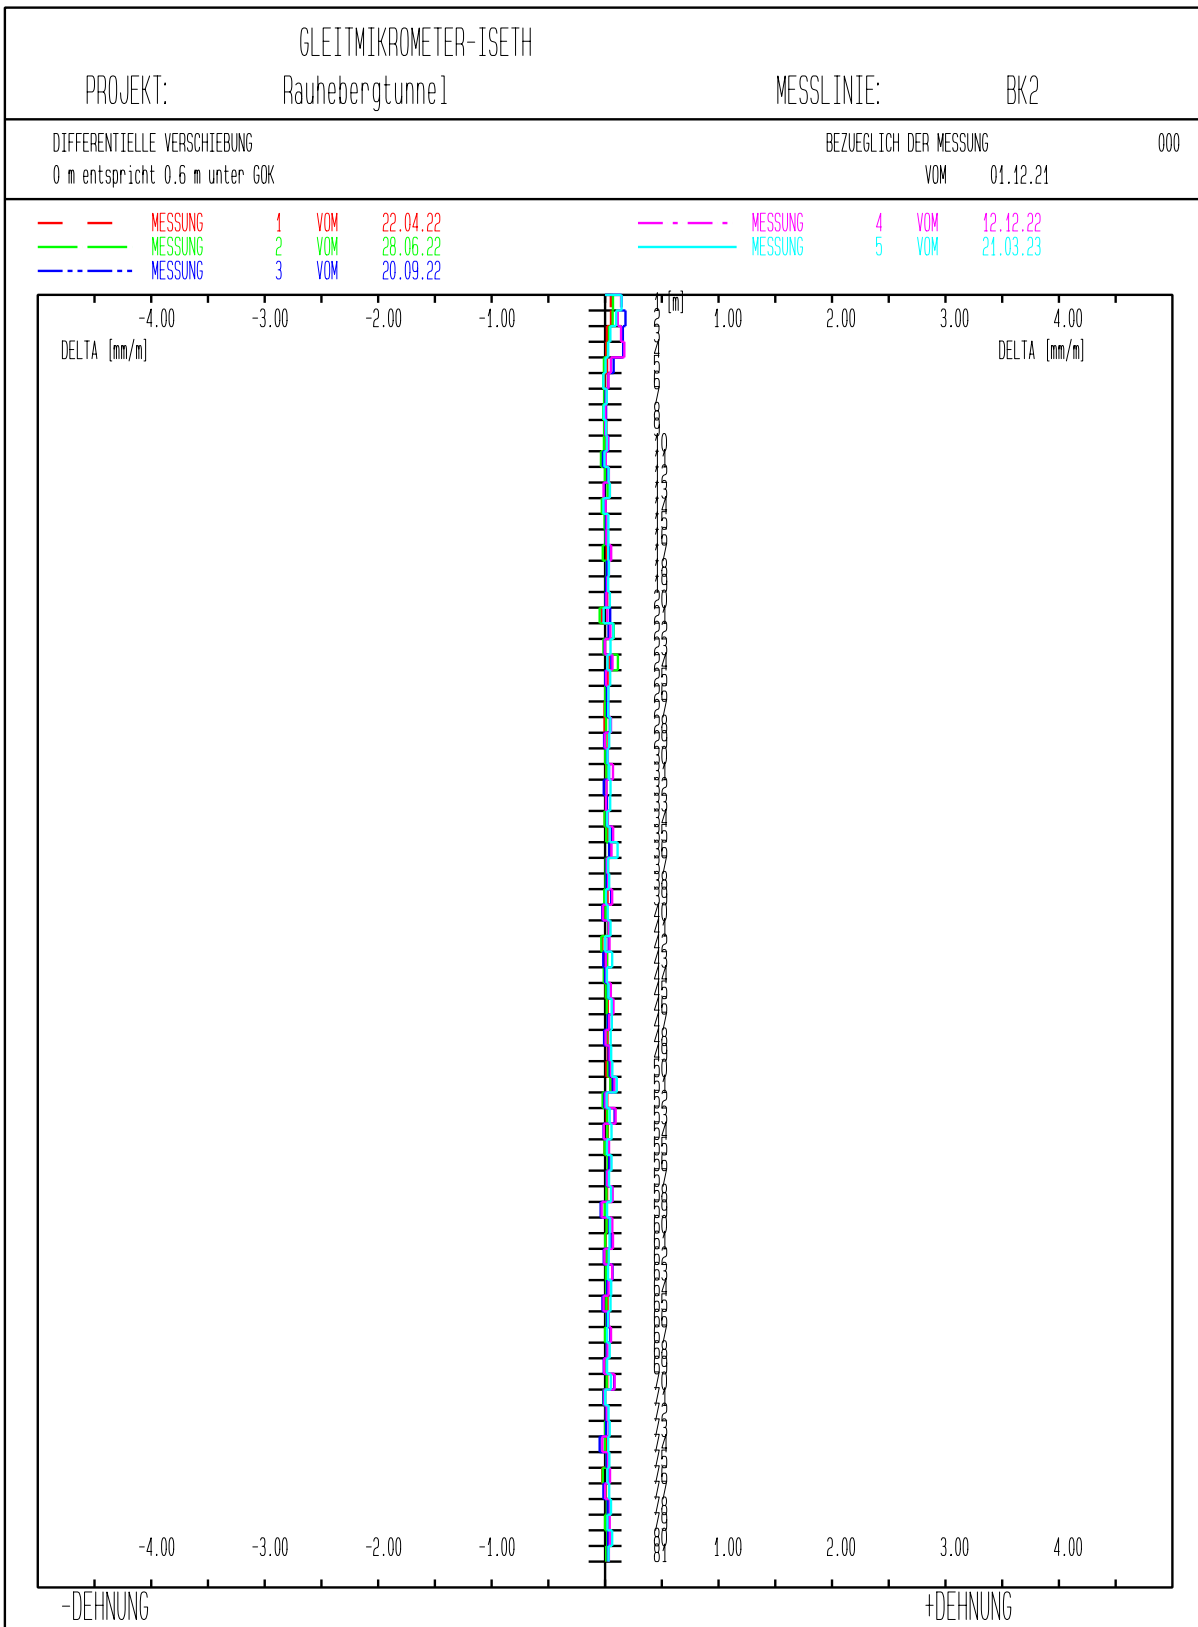

ANLAGE: 01 B

