

Projektname: Rauhebergtunnel

Meßreihennr. : 008

Meßrohrname: BK17

Datum : 17.07.24

Meßschritte: 122

Bezugsmessung : 000

Anmerkung :

Schritt Nr.	Verformung pro Meter [mm/m]	Gesamt Verformung [mm]	Kalibrierter Meßwert [µm]
1	-0.1588	-1.8378	90
2	-0.1120	-1.6789	370
3	-0.0299	-1.5669	545
4	-0.0289	-1.5371	832
5	-0.0257	-1.5081	105
6	-0.0221	-1.4824	758
7	-0.0278	-1.4603	-1070
8	-0.0066	-1.4325	553
9	-0.0378	-1.4259	-3769
10	-0.0811	-1.3882	-5900
11	-0.0992	-1.3071	-6642
12	-0.0598	-1.2079	-5315
13	-0.0526	-1.1481	-4176
14	-0.0327	-1.0955	-1886
15	-0.0308	-1.0628	-1016
16	-0.0274	-1.0320	-215
17	-0.0132	-1.0046	359
18	-0.0031	-0.9914	736
19	-0.0101	-0.9884	725
20	-0.0201	-0.9783	878
21	-0.0263	-0.9582	794
22	-0.0059	-0.9319	638
23	-0.0174	-0.9260	681
24	-0.0185	-0.9087	721
25	-0.0078	-0.8901	995
26	-0.0167	-0.8824	758
27	-0.0155	-0.8657	723
28	-0.0066	-0.8501	1255
29	-0.0192	-0.8436	1111
30	-0.0118	-0.8244	928
31	-0.0171	-0.8126	890
32	-0.0198	-0.7955	860
33	-0.0117	-0.7757	880
34	-0.0189	-0.7640	739
35	-0.0120	-0.7452	850
36	-0.0135	-0.7332	899
37	-0.0196	-0.7197	1177
38	-0.0219	-0.7001	899
39	-0.0205	-0.6781	952

Projektname: Rauhebergtunnel
Meßrohrname: BK17
Meßschritte: 122
Anmerkung :

Meßreihenr. : 008
Datum : 17.07.24
Bezugsmessung : 000

Schritt Nr.	Verformung pro Meter [mm/m]	Gesamt Verformung [mm]	Kalibrierter Meßwert [μ m]
40	-0.0221	-0.6576	942
41	-0.0144	-0.6356	1084
42	-0.0144	-0.6211	1025
43	-0.0206	-0.6067	1004
44	-0.0129	-0.5861	921
45	-0.0118	-0.5733	1103
46	-0.0211	-0.5614	1110
47	-0.0093	-0.5403	1229
48	-0.0176	-0.5311	1060
49	-0.0070	-0.5134	1317
50	-0.0347	-0.5064	1198
51	0.0012	-0.4717	1183
52	-0.0095	-0.4729	1380
53	-0.0080	-0.4635	1434
54	-0.0197	-0.4554	1392
55	-0.0060	-0.4357	1200
56	-0.0059	-0.4297	1216
57	-0.0155	-0.4238	1421
58	-0.0123	-0.4082	1340
59	-0.0098	-0.3960	1455
60	-0.0004	-0.3861	1515
61	-0.0128	-0.3857	1457
62	-0.0085	-0.3730	1430
63	-0.0153	-0.3644	1455
64	0.0013	-0.3492	1775
65	-0.0067	-0.3505	1473
66	-0.0072	-0.3438	1536
67	-0.0097	-0.3367	1646
68	-0.0085	-0.3270	1494
69	-0.0082	-0.3185	1358
70	-0.0036	-0.3103	1609
71	-0.0089	-0.3068	1617
72	-0.0111	-0.2978	1712
73	-0.0118	-0.2867	1568
74	0.0021	-0.2749	1866
75	-0.0101	-0.2770	1710
76	-0.0115	-0.2669	1903
77	0.0038	-0.2554	1831
78	-0.0055	-0.2592	1853
79	-0.0081	-0.2537	1954

Projektname: Rauhebergtunnel
Meßrohrname: BK17
Meßschritte: 122
Anmerkung :

Meßreihenr. : 008
Datum : 17.07.24
Bezugsmessung : 000

Schritt Nr.	Verformung pro Meter [mm/m]	Gesamt Verformung [mm]	Kalibrierter Meßwert [μ m]
80	-0.0118	-0.2457	1628
81	-0.0053	-0.2339	1643
82	-0.0082	-0.2286	1707
83	-0.0100	-0.2204	1609
84	-0.0070	-0.2104	1725
85	-0.0060	-0.2034	1845
86	-0.0041	-0.1974	1719
87	-0.0164	-0.1933	1722
88	-0.0013	-0.1768	1759
89	-0.0134	-0.1755	2202
90	-0.0116	-0.1622	1537
91	-0.0129	-0.1506	1496
92	-0.0140	-0.1377	1957
93	-0.0022	-0.1237	2125
94	-0.0102	-0.1215	1875
95	0.0077	-0.1113	1946
96	-0.0214	-0.1190	1489
97	-0.0162	-0.0976	1692
98	0.0187	-0.0814	1847
99	-0.0186	-0.1002	1816
100	-0.0248	-0.0815	1670
101	-0.0124	-0.0567	1796
102	-0.0055	-0.0444	1676
103	-0.0015	-0.0389	1676
104	-0.0101	-0.0374	1824
105	0.0024	-0.0273	1725
106	-0.0167	-0.0296	1631
107	-0.0232	-0.0129	1623
108	-0.0148	0.0103	1805
109	0.0155	0.0251	1703
110	0.0048	0.0096	1958
111	-0.0020	0.0047	1965
112	0.0011	0.0067	2046
113	0.0087	0.0056	2004
114	-0.0002	-0.0031	1653
115	-0.0057	-0.0029	1880
116	-0.0037	0.0029	1647
117	-0.0287	0.0066	1850
118	0.0260	0.0353	1708
119	-0.0082	0.0094	1527

Projektname: Rauhebergtunnel

Meßreihenr. : 008

Meßrohrname: BK17

Datum : 17.07.24

Meßschritte: 122

Bezugsmessung : 000

Anmerkung :

Schritt Nr.	Verformung pro Meter [mm/m]	Gesamt Verformung [mm]	Kalibrierter Meßwert [μ m]
120	-0.0008	0.0176	1879
121	0.0377	0.0184	1754
122	-0.0194	-0.0194	1552

GLEITMIKROMETER AUSWERTUNG

Anlage 03

Projektname: Rauhebergtunnel

Meßreihennr. : 008

Meßrohrname: BK17

Datum : 17.07.24

Meßschritte: 122

Bezugsmessung : 000

Anmerkung :

Nr	Meßwert abwärts [μm]	Meßwert aufwärts [μm]	mittlerer Meßwert [μm]	Differenz zw. ab u. auf Messung [μm]
1	284	282	283	2
2	563	565	564	-2
3	737	741	739	-4
4	1018	1036	1027	-18
5	301	296	299	5
6	952	954	953	-2
7	-876	-884	-880	8
8	750	745	748	5
9	-3588	-3583	-3586	-5
10	-5722	-5722	-5722	0
11	-6465	-6467	-6466	2
12	-5133	-5139	-5136	6
13	-3994	-3994	-3994	0
14	-1701	-1694	-1698	-7
15	-825	-827	-826	2
16	-41	-4	-23	-37
17	556	550	553	6
18	925	936	931	-11
19	924	915	920	9
20	1069	1077	1073	-8
21	982	996	989	-14
22	836	830	833	6
23	872	879	876	-7
24	912	919	915	-7
25	1195	1187	1191	8
26	951	954	953	-3
27	918	918	918	0
28	1456	1447	1451	9
29	1299	1315	1307	-16
30	1127	1120	1123	7
31	1084	1087	1085	-3
32	1053	1057	1055	-4
33	1076	1074	1075	2
34	929	938	934	-9
35	1048	1043	1046	5
36	1096	1092	1094	4
37	1370	1377	1373	-7
38	1091	1098	1094	-7
39	1148	1147	1147	1

Projektname: Rauhebergtunnel
Meßrohrname: BK17
Meßschritte: 122
Anmerkung :

Meßreihennr. : 008
Datum : 17.07.24
Bezugsmessung : 000

40	1134	1140	1137	-6
41	1277	1283	1280	-6
42	1224	1217	1220	7
43	1199	1200	1200	-1
44	1115	1117	1116	-2
45	1300	1297	1299	3
46	1304	1308	1306	-4
47	1428	1423	1425	5
48	1252	1259	1255	-7
49	1515	1511	1513	4
50	1389	1399	1394	-10
51	1383	1375	1379	8
52	1577	1577	1577	0
53	1633	1629	1631	4
54	1579	1599	1589	-20
55	1399	1394	1397	5
56	1415	1409	1412	6
57	1620	1616	1618	4
58	1537	1536	1537	1
59	1651	1653	1652	-2
60	1713	1711	1712	2
61	1656	1652	1654	4
62	1627	1626	1627	1
63	1649	1654	1651	-5
64	1974	1971	1972	3
65	1670	1669	1669	1
66	1733	1732	1733	1
67	1845	1842	1844	3
68	1693	1689	1691	4
69	1556	1553	1555	3
70	1810	1802	1806	8
71	1813	1815	1814	-2
72	1901	1917	1909	-16
73	1768	1763	1765	5
74	2066	2062	2064	4
75	1909	1905	1907	4
76	2102	2100	2101	2
77	2033	2024	2029	9
78	2052	2049	2051	3
79	2150	2154	2152	-4

Projektname: Rauhebergtunnel
Meßrohrname: BK17
Meßschritte: 122
Anmerkung :

Meßreihennr. : 008
Datum : 17.07.24
Bezugsmessung : 000

80	1825	1826	1826	-1
81	1842	1838	1840	4
82	1907	1901	1904	6
83	1808	1804	1806	4
84	1921	1923	1922	-2
85	2043	2042	2042	1
86	1914	1918	1916	-4
87	1921	1918	1919	3
88	1961	1953	1957	8
89	2399	2403	2401	-4
90	1734	1734	1734	0
91	1695	1691	1693	4
92	2154	2156	2155	-2
93	2327	2321	2324	6
94	2071	2075	2073	-4
95	2146	2142	2144	4
96	1681	1691	1686	-10
97	1886	1892	1889	-6
98	2041	2049	2045	-8
99	2005	2023	2014	-18
100	1854	1880	1867	-26
101	1991	1996	1994	-5
102	1875	1871	1873	4
103	1875	1871	1873	4
104	2021	2023	2022	-2
105	1923	1922	1923	1
106	1827	1829	1828	-2
107	1820	1820	1820	0
108	2000	2006	2003	-6
109	1901	1900	1900	1
110	2156	2156	2156	0
111	2162	2165	2163	-3
112	2238	2251	2245	-13
113	2204	2201	2202	3
114	1849	1851	1850	-2
115	2079	2076	2077	3
116	1844	1844	1844	0
117	2041	2054	2048	-13
118	1906	1904	1905	2
119	1723	1724	1724	-1

GLEITMIKROMETER AUSWERTUNG

Anlage 03

Projektname: Rauhebergtunnel

Meßreihenr. : 008

Meßrohrname: BK17

Datum : 17.07.24


Meßschritte: 122

Bezugsmessung : 000

Anmerkung :

120	2075	2079	2077	-4
121	1957	1947	1952	10
122	1740	1758	1749	-18

ANLAGE: 03 A

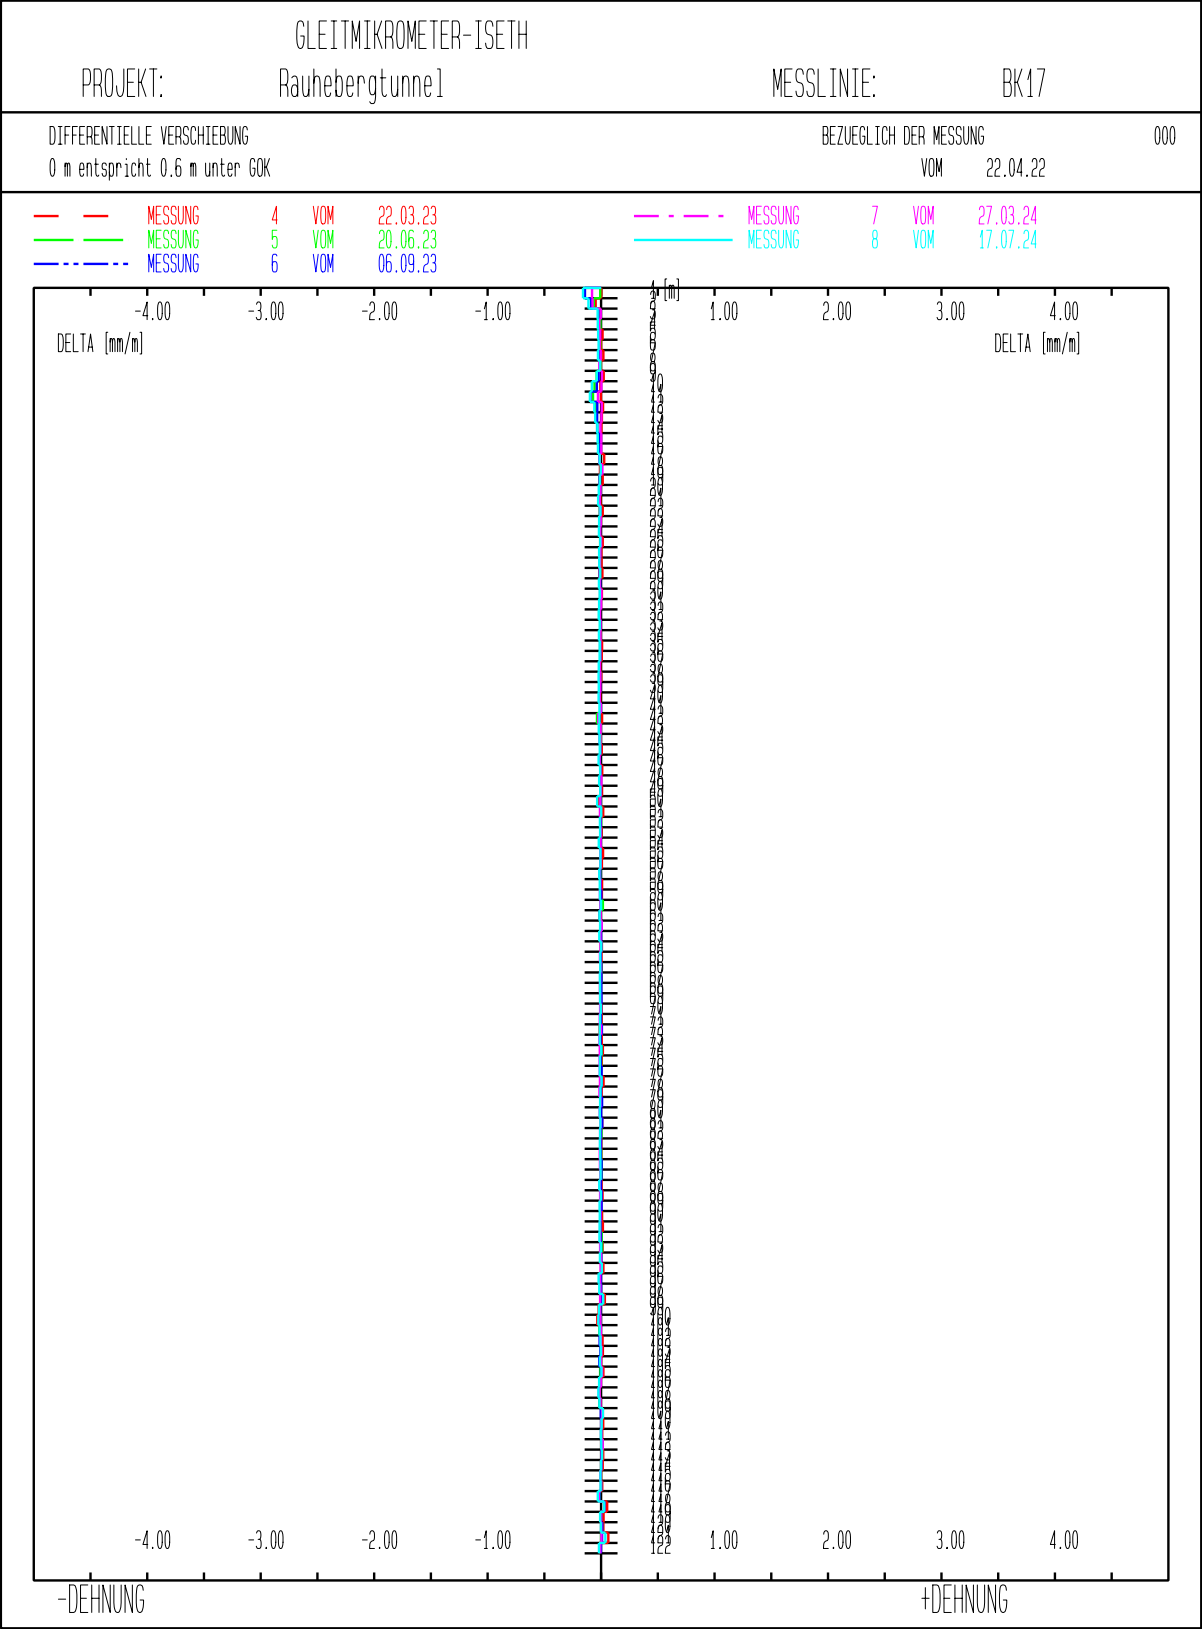

ANLAGE: 03 B

